



**2025 жылдың 1-жарты жылдығына арналған
«Қарағанды Жарық» ЖШС бекітілген тарифтік
сметаның орындалуы және бекітілген инвестициялық
бағдарламаның орындалуы туралы есеп**

Қазақстан Республикасы
Қарағанды қ.
2025 ж.

Компанияның сипаттамасы



Құрылды: 1 наурыз 2003 ж.

Негізгі қызмет түрі: Электр энергиясын беру.

Өзге қызмет түрлері: Уәкілетті органмен келісілген қызметтер

Атауы	Өлш.бірл.	Саны
220-110-35-10-6-0,4кВ АЖ	км	5 149
35-10-6-0,4кВ КЖ	км	1 744
220-110-35 кВ шағын станциялар	дана	104
ТШС (трансформаторлық шағын станциясы), ЖТШС, ДТШС, ТШС (тарату шағын станциясы), ОТП	дана	2 237
Жалпы трансформаторлық қуат	мың.кВА	4 087
Күштік трансформаторлардың саны	дана	2 570
Қызмет көрсету аумағы	мың км. ²	21,39

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп



№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге			
	Іс-шара атауы	Өлше м бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Өткен жылдың Нақтысі		Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқудың себептері	Өз қаражаттары		Қарыз қаражат тары	Бюджетті қаражат ар
			Жоспар	Нақты							Амортизация	Пайда		
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда-Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9	-	2021-2027	1 1,9	2 112 400	814 876	-1 297 523	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру		814 876		
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9	1 2,9	2021-2025	1 2,9	320 932	998 373	677 441	2024 ж. өтпелі орындау реттеуші кезең 2024-2025 жж.	828 103	170 270		
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	58,97	-	2021-2027	58,97	2 291 383	852 750	-1 438 632	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру	852 750			
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. дана км. км. дана	80,13 45,21 24 0,84 0,61 7	70,02 23,34 21 0,84 - 6	2021-2029	9,01 2,43 33 0,43 1,67 25	2 891 260	1 443 004	-1 448 256	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру	1 443 004			
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және 6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Караганды қ.)	дана	796	-	2023-2027	360	2 469 715	1 477 480	-992 235	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру		1 477 480		
6	«Вольная – Карагандинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту	км	8,62	-	2024-2027	8,62	62 204		-62 204	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру				
7	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1	-	2024-2026	1	1 416 300	346 710	-1 069 590	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру		346 710		
8	Н.Город ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-	2024-2025	1	109 285		-109 285	2024 жылы 2024-2025 жж. реттеуші кезеңде іске асырылды.				

110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу



есептің жалғасы



№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге				
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны												
			Жоспар	Нақты											Өткен жылдың Нақтысі
					Амортизация	Пайда									
9	Новая Дубовка ҚС (күштік трансформатор) жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-	2025-2026	-	126 599			-126 599	2026 жылы іске асыру 2025-2026 жж. реттеуші кезең				
10	Озерная-2 (күштік трансформатор) жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	2024-2025	-	90 150	180 300	90 150		2024 жылғы өтпелі орындау 2024-2025 жж. реттеуші кезең	180 300			
11	35 кВ КЖ қайта жаңғырту	км.	5,6	-	2025-2026	-	104 423			-104 423	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру				
12	110/35/6кВ "Кзыл" (35-110кВ АТҚ) ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-	2025-2028	-	22 536			-22 536	2026 жылы іске асыру 2025-2026 жж. реттеуші кезең				
13	Ялтинская ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-	2025-2026	-	78 421			-78 421	2026 жылы іске асыру 2025-2026 жж. реттеуші кезең				
14	Карагайлы ҚС 110кВ АТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-	2024-2025	1	735			-735	2024 жылы 2024-2025 жж. реттеуші кезеңде іске асырылды.				
15	110/10/6кВ "Мелькомбинат« ҚС 6кВ ЖТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	2024-2025; 2026-2027	-	800	1 600	800		2024 жылғы өтпелі орындау 2024-2025 жж. реттеуші кезең	1 600			
16	110/35/6кВ "Астаховка« ҚС антенналық-діңгекті құрылыс салу	дана	1	1	2024-2025; 2026-2027	-	1 818	3 600	1 782		2024 жылғы өтпелі орындау 2024-2025 жж. реттеуші кезең	3 600			
17	«Костенко» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	2024-2025; 2026-2027	-	634	1 200	566		2024 жылғы өтпелі орындау 2024-2025 жж. реттеуші кезең	1 200			
18	«Победа» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	2024-2025; 2026-2027	-	666	1 300	635		2024 жылғы өтпелі орындау 2024-2025 жж. реттеуші кезең	1 300			
19	Ялтинская ҚС, Озерная ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-	2024-2025	1	3 274			-3 274	2024 жылы 2024-2025 жж. реттеуші кезеңде іске асырылды.				

"Жаңа Майкұдық" ПС 110/10кВ құрылысы



есептің жалғасы



№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат, мың теңге			
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны										
			Жоспар	Нақты		Өткен жылдың Нақтысі	Жоспар	Нақты	Ауытқу	Ауытқудың себептері			
											Өз қаражаттары		Қарыз қаражаттары
Амортизация	Пайда												
20	"Цементная» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	2024-2025 -	2 574	5 149	2 574	2024 жылғы өтпелі орындау 2024-2025 жж. реттеуші кезең		5 149		
21	35кВ "ТПП-2 - Сергиополь« АЖ 2т. Қайта салу	км.	28,33	28,33	2024-2025; 2026-2027 -	6 659	10 255	3 596	2024 жылғы өтпелі орындау 2024-2025 жж. реттеуші кезең		10 255		
22	35кВ "Токаревка - Туздинская" АЖ қайта салу	км.	1	1	2024-2025 -	625		-625	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру				
23	35кВ Караган-Озерная АЖ қайта салу	км.	12,2	12,2	2024-2025; 2026-2027 -	2 148	4 295	2 147	2024 жылғы өтпелі орындау 2024-2025 жж. реттеуші кезең		4 295		
24	Қзыл электр қосалқы станциясы ғимаратының шатырын күрделі жөндеу	дана	1	-	2024-2025 1	15 534		-15 534	2024 жылы 2024-2025 жж. реттеуші кезеңде іске асырылды.				
25	Саран қ., Жеңіс көш., 28а кеңсе ғимаратының шатырын қайта құру	дана	1	-	2024-2025 1	9 160		-9 160	2024 жылы 2024-2025 жж. реттеуші кезеңде іске асырылды.				
26	Ульяновка ТҚ жөндеу-өндірістік шеберханалары ғимаратының шатырын қайта салу	дана	1	-	2024-2025 1	10 868		-10 868	2024 жылы 2024-2025 жж. реттеуші кезеңде іске асырылды.				
27	«Придолинка» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	2024-2026 -	116 846	153 908	37 062	2024 жылғы өтпелі орындау 2024-2025 жж. реттеуші кезең		153 908		
«Тарифін инвестицияға айырбастау" бағдарламасы аясындағы қосымша іс-шаралар:													
28	35кВ Победа-Энгельса АЖ қайта салу	км.	15,32	-	2025-2026 -	49 645		-49 645	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру				
29	110/10кВ «Болашақ» ҚС салу	дана	1	-	2025-2026 -	1 146 190		-1 146 190	іс-шараларды жыл соңына дейін іске асыру				
	Барлығы					13 463 784	6 294 801	-5 973 148		3 123 857	3 168 695		





есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**							
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Трансформатор тобының қуаты, МВА		Басқа Көрсеткіштер Кернеу көрсеткіштерін МемСТ сәйкестігіне келтіру, Вольт		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %	
			Жоспар	Нақты	Быттырғы жылға нақты	Ағымдағы жылға нақты	Жоспар	Нақты	Быттырғы жылға нақты	Ағымдағы жылға нақты	Быттырғы жылға нақты	Ағымдағы жылға нақты
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Қарағанда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Қарағанда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Қарағанда-Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 2. Қайта салу 35кВ Қарағанда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Қарағанда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Қарағанда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9	1 2,9	-	80	-	-	-	-	-	-
3	Қарағанда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Қарағанда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Қарағанда ШС 110 кВ АЖ	км.	58,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км. дана	80,13 45,21 24 0,84 0,61 7	70,02 23,34 21 0,84 - 6	3,72	3,09	199-242 үшін 125,34км.	199-242 үшін 93,36км.		80,2% үшін 80,13км. КАЖ-0,4кВ 80,2% үшін 45,21 км. КАЖ-6(10)кВ 78% үшін 24 дана ТҚС (ЖТҚС)	80,2% үшін 70,02км. КАЖ-0,4кВ 80,2% үшін 23,34 км. КАЖ-6(10)кВ 78% үшін 21 дана ТҚС (ЖТҚС)	
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	компл.	796	-								
6	«Вольная – Қарагадинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту	км.	8,62	-								
7	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1	-								
8	Н.Город ШС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-								
9	Новая Дубовка ҚС (күштік трансформатор) жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-								9

0,4-6-10кВ электр желілері



есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**							
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Трансформатор тобының қуаты, МВА		Басқа Көрсеткіштер Кернеу көрсеткіштерін МемСТ сәйкестігіне келтіру, Вольт		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты шикізат, материалдар, отын және энергия шығынын заттай мәнде төмендету		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %	
			Жоспар	Нақты	Бытырғы жылға нақты	Ағымдағы жылға нақты	Жоспар	Нақты	Бытырғы жылға нақты	Ағымдағы жылға нақты	Бытырғы жылға нақты	Ағымдағы жылға нақты
10	Озерная-2 ҚС (күштік трансформатор) жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	-	-	-	-	-	-	86	86
11	35 кВ КЖ қайта салу	км.	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	110/35/6кВ "Кзыл" ҚС (35-110кВ АТҚ) жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ялтинская ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-								
14	Қарағайлы ҚС 110кВ АТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-								
15	110/10/6кВ ПС "Мелькомбинат ҚС 6кВ ЖТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1								
16	110/35/6кВ "Астаховка" ҚС антенналық-дінгекті құрылыс салу	дана	1	1								
17	«Костенко» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1								
18	«Победа» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1								
19	Ялтинская ҚС, Озерная ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-								
20	"Цементная" ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1								
21	35кВ "ГПП-2 - Сергиополь" АЖ 2т. қайта салу	км.	28,33	28,33								
22	35кВ "Токаревка - Туздинская" АЖ қайта салу	км.	1	1								
23	35кВ Қараған-Озерная АЖ қайта салу	км.	12,2	12,2								
24	Кзыл электр қосалқы станциясы ғимаратының шатырын күрделі жөндеу	дана	1	-								
25	Саран к., Жеңіс көш., 28а кеңсе ғимаратының шатырын қайта құру	дана	1	-								
26	Ульяновка ТҚ жөндеу-өндірістік шеберханалары ғимаратының шатырын қайта салу	дана	1	-								
«Тарифі инвестицияға айырбастау» бағдарламасы аясындағы қосымша іс-шаралар:												
28	35кВ Победа-Энгельса АЖ қайта салу	км.	15,32	-								
29	110/10кВ "Болашақ" ҚС салу	дана	1	-								

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**							
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Желінің (желінің) құрылған (салынған және пайдалануға берілген) учаскелері, км.		Басқа Көрсеткіштер Тұтынушыларға электр энергиясын толық жібермеу, 24 сағат ішінде мың кВт*сағ.		Басқа мақсаттар Нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкессіздікті жою		Басқа Көрсеткіштер Құрылған (салынған және пайдалануға берілген) өндірістік негізгі құралдар	
			Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда-Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9	1 2,9	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	58,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км. дана	80,13 45,21 24 0,84 0,61 7	70,02 23,34 21 0,84 - 6	1,45	0,84					7	6
5	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	компл.	796	-								
6	«Вольная – Карагандинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту	км.	8,62	-								
7	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1	-								
8	Н.Город ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	-								
9	Новая Дубовка ҚС (күштік трансформатор) жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	-								

12

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ п/п	Реттелін көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**							
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Желінің (желінің) құрылған (салынған және пайдалануға берілген) учаскелері, км.		Басқа Көрсеткіштер Тұтынушыларға электр энергиясын толық жібермеу, 24 сағат ішінде мың кВт*сағ.		Басқа мақсаттар Нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкессіздікті жою		Басқа Көрсеткіштер Құрылған (салынған және пайдалануға берілген) өндірістік негізгі құралдар	
			Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты
10	Озерная-2 ҚС (күштік трансформатор) жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	35 кВ КЖ қайта салу	км.	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	110/35/6кВ "Қзыл" ҚС (35-110кВ АТҚ) жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ялтинская ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-								
14	Қарағайлы ҚС 110кВ АТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-								
15	110/10/6кВ ПС "Мелькомбинат ҚС 6кВ ЖТҚ жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1								
16	110/35/6кВ "Астаховка" ҚС антенналық-діңгекті құрылыс салу	дана	1	1								
17	«Костенко» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1								
18	«Победа» ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1								
19	Ялтинская ҚС, Озерная ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту,	дана	1	-								
20	"Цементная" ҚС жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	1								
21	35кВ "ГПП-2 - Сергиополь" АЖ 2т. қайта салу.	км.	28,33	28,33								
22	35кВ "Токаревка - Туздинская" АЖ қайта салу	км.	1	1								
23	35кВ Қараған-Озерная АЖ қайта салу	км.	12,2	12,2								
24	Қзыл электр қосалқы станциясы ғимаратының шатырын күрделі жөндеу	дана	1	-								
25	Саран қ., Желіс көш., 28а кеңсе ғимаратының шатырын қайта құру	дана	1	-								
26	Ульяновка ТҚ жөндеу-өндірістік шеберханалары ғимаратының шатырын қайта салу	дана	1	-								
«Тарифі инвестицияға айырбастау» бағдарламасы аясындағы қосымша іс-шаралар:												
28	35кВ Победа-Энгельса АЖ қайта салу	км.	15,32	-								
29	110/10кВ "Болашақ" ҚС салу	дана	1	-								

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**				Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
			Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Былтырғы жылға нақты	Ағымдағы жылға нақты		
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда-Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9	-	-	-	-	-	-	
2	110/10кВ "Новый Майкудук" ШС салу: 1. 110/10кВ ШС салу; 2. 110кВ "Сантехническая-Новый Майкудук" АЖ салу, 1 және 2-тізбектер	дана км.	1 2,9	1 2,9	-	-	-	-	-	
3	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	58,97	-	-	-	-	-	-	
4	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км. дана	80,13 45,21 24 0,84 0,61 7	70,02 23,34 21 0,84 - 6						
5	Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи нижнего уровня 6/10 кВ SCADA (г. Караганды)	компл.	796	-						
6	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және6/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Караганды қ.)	компл.	8,62	-						
7	«Вольная – Карагандинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту	км.	1	-						
8	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1	-						
9	Новая Дубовка ҚС (күштік трансформатор) жабдықтарын техникалық жаңғырту	дана	1	-						

14

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**				Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
			Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Быттырғы жылға нақты	Ағымдағы жылға нақты		
10	Озерная-2 ҚС (күштік трансформатор) жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	1	-	0,21	-	-	-	-
11	35 кВ КЖ қайта салу	км.	5,6	-	-	-	-	-	-	-
12	110/35/6кВ "Қзыл" ҚС (35-110кВ АТҚ) жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Ялтинская ҚС жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	-						
14	Қарағайлы ҚС 110кВ АТҚ жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	-						
15	110/10/6кВ ПС "Мелькомбинат ҚС 6кВ ЖТҚ жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	1						
16	110/35/6кВ "Астаховка" ҚС антенналық-діңгекті құрылыс салу	дана	1	1						
17	«Костенко» ҚС жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	1						
18	«Победа» ҚС жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	1						
19	Ялтинская ҚС , иОзерная ҚС жабдыктарын техникалық жаңғырту,	дана	1	-						
20	"Цементная» ҚС жабдыктарын техникалық жаңғырту	дана	1	1						
21	35кВ "ГПП-2 - Сергиополь" АЖ 2т. қайта салу.	км.	28,33	28,33						
22	35кВ "Токаревка - Туздинская" АЖ қайта салу	км.	1	1						
23	35кВ Қараған-Озерная АЖ қайта салу	км.	12,2	12,2						
24	Қзыл электр қосалқы станциясы ғимаратының шатырын күрделі жөндеу	дана	1	-						

есептің жалғасы. Орындалудың нақты көрсеткіштерін салыстыру



№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат				инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**				Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштегі саны		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
			Жоспар	Нақты	Жоспар	Нақты	Былтырғы жылға нақты	Ағымдағы жылға нақты		
25	Саран к., Жеңіс көш., 28а кеңсе ғимаратының шатырын қайта құру	дана	1	-						
26	Ульяновка ТҚ жөндеу-өндірістік шеберханалары ғимаратының шатырын қайта салу	дана	1	-						
	«Тарифі инвестицияға айырбастау" бағдарламасы аясындағы қосымша іс-шаралар:									
28	35кВ Победа-Энгельса АЖ қайта салу	км.	15,32	-						
29	110/10кВ "Болашақ" ҚС салу	дана	1	-						

Пайдалар мен залалдар туралы есеп, мың теңге



Көрсеткіштер атауы	Жол коды	Есепті жылда	Өткен жылда
Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуден түсетін түсім	010	38 831 671	16 386 964
Өткізілген тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	011	30 892 968	11 197 429
Жалпы пайда (залал) (010-жол – 011-жол)	012	7 938 703	5 189 535
Сату бойынша шығыстар	013	803 433	-
Әкімшілік шығыстар	014	754 427	572 911
Операциялық пайда жиыны (залал) (+/- 012-014 аралығындағы жолдар)	020	6 380 843	4 616 624
Қаржылық кірістері	021	114 940	767 076
Қаржылық шығыстары	022	7 397	5 376
Үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің пайдасындағы (залалындағы) ұйымның үлесі	023	-	-
Өзге кірістер	024	661 741	630 130
Өзге шығыстар	025	490 528	1 037 165
Салық салғанға дейінгі пайда (залал) (+/- 020-025 аралығындағы жолдар)	100	6 659 598	4 971 289
Табыс салығы бойынша шығыстар (-) (кірістер +))	101	(646 489)	(1 326 685)
Салық салғаннан кейін жалғасатын қызметтен түсетін пайда (залал) (100-жол + 101-жол)	200	6 013 109	3 644 604
Салық салғаннан кейін тоқтатылған қызметтен түсетін пайда (залал)	201	-	-
Мыналарға қатысты бір жылғы пайда (200-жол + 201-жол):	300	6 013 109	3 644 604
негізгі ұйымның меншік иелері	-	-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	-	-	-
Өзге де жиынтық табыс, барлығы (420 және 440 сома):	400	-	-
оның ішінде:			
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құймен бағаланған борыш қаржылық құралдарды қайта бағалау	410	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	411	-	-
мерзімі кейінге қалдырылған табыс салығы мөлшерлемесін өзгеру әсері	412	-	-
ақша ағындарын хеджирлеу	413	-	-
шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша бағамдық айырма	414	-	-
шетелдік операцияларға таза инвестицияларды хеджирлеу	415	-	-
өзге жиынтық табыстың өзге де құрауыштары	416	-	-
пайда (залал) құрамында қайта жіктеу кезіндегі түзету	417	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	418	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергендегі) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктелген өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (410-418 аралығындағы жолдардың сомасы)	420	-	-
негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді қайта бағалау	431	-	-
үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын қауымдасқан ұйымдар мен бірлескен қызметтің өзге де жиынтық табысындағы (залалындағы) үлесі	432	-	-
зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (залал)	433	-	-
өзге де жиынтық табыс құрауыштарының салықтық әсері	434	-	-
өзге де жиынтық табыс арқылы әділ құймен бағаланған үлестік қаржылық құралдарды қайта бағалау	435	-	-
Кейінгі кезеңдерде (табысқа салынатын салықты шегергенде) кірістерге немесе шығыстарға қайта жіктеуге жатпайтын өзге де жиынтық табыстың жиынтығы (431-435 аралығындағы жолдардың сомасы)	440	-	-
Жалпы жиынтық табыс (300-жол + 400-жол)	500	6 013 109	3 644 604
Мыналарға тиесілі жалпы жиынтық табыс:			
негізгі ұйымның меншік иелері	-	-	-
бақыламайтын меншік иелерінің үлесі	-	-	-
Акцияға арналған пайда:	600	-	-
оның ішінде:			
Акцияға арналған базалық пайда:			
жалғасатын қызметтен	-	-	-
тоқтатылған қызметтен	-	-	-
Акцияға арналған ажыратылған пайда:			
жалғасатын қызметтен	-	-	-
тоқтатылған қызметтен	-	-	-

Тарифтік сметаның бап бойынша орындалуы



№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %
I	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	23 288 608	11 204 582	-52%
1.	Материалдық шығындар, барлығы	мың теңге	461 644	268 011	-42%
1.1	сатып алынған өнімдер мен жартылай фабрикаттар	мың теңге	75 062	74 567	-1%
1.2	ЖЖМ	мың теңге	223 803	73 558	-67%
1.3	энергия	мың теңге	162 779	119 886	-26%
2	Еңбек шығындарын төлеу, барлығы	мың теңге	7 532 454	3 910 526	-48%
3	Амортизация, барлығы	мың теңге	7 199 806	3 117 965	-57%
4	Жөндеу, барлығы	мың теңге	1 325 934	291 655	-78%
5	Өндірістік сипаттағы Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы	мың теңге	75 734	40 760	-46%
5.3	қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	56 734	40 760	-28%
5.4	сараптамалық қызметтер	мың теңге	19 000	-	-100%
5.5	Бөгде ұйымдардың өзге де қызметтері	мың теңге	526 016	210 696	-60%
6	Өзге де шығындар, барлығы	мың теңге	11 329	8 516	-25%
6.1	коммуналдық шаруашылық қызметтері	мың теңге	19 022	12 820	-33%
6.2	байланыс қызметтері	мың теңге	123 206	63 279	-49%
6.3	объектілерді күзету	мың теңге	13 902	4 056	-71%
6.4	іссапар шығындары	мың теңге	13 776	3 595	-74%
6.5	бағыттық қағаздар бойынша жол жүру	мың теңге	192 252	29 582	-85%
6.6	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы	мың теңге	95 541	51 089	-47%
6.7	аспаптарды тексеру	мың теңге	5 559	2 933	-47%
6.8	машиналар мен жабдықтарға қызмет көрсету	мың теңге	854	514	-40%
6.9	МАИ қызметтері	мың теңге	7 483	4 486	-40%
6.10	автокөлікті сақтандыру	мың теңге	790	1 290	63%
6.11	БАҚ, кеңес беру	мың теңге	14 338	5 778	-60%
6.12	кеңсе және басқа жабдықтарды ұстау	мың теңге	5 746	702	-88%
6.13	кадрларды даярлау	мың теңге	3 093	2 486	-20%
6.15	пошта-кеңсе шығындары	мың теңге	755	-	-100%
6.17	экологиялық қауіпсіздік	мың теңге	12 944	4 470	-65%
6.18	сынақтар жүргізу, есептеулер, техникалық консультациялар	мың теңге	5 426	15 098	178%
6.20	МЕА байланысты шығындар	мың теңге	4 858 572	2 749 524	-43%
7	Нормативтік шығындардың құны	мың теңге	608 764	332 497	-45%
8	Жүктемені көтеруге эл. қуатының дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі қызмет	мың теңге	679 875	275 350	-59%
9	Бөгде желілер арқылы тасымалдау құны	мың теңге	19 809	7 598	-62%
10	Теңгерімдеуші нарық бойынша қызметтердің құны	мың теңге	23 288 608	11 204 582	-52%

кестенің жалғасы




№ р/с	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш.бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу, %
II	Барлық шығындар:	мың теңге	1 115 766	527 474	-53%
11	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы	мың теңге	1 115 766	527 474	-53%
11.1	ӘБП жалақысы	мың теңге	514 024	231 473	-55%
11.4	НҚ және МЕА амортизация	мың теңге	-	4 760	
11.5	салық төлемдері	мың теңге	562 168	265 437	-53%
11.6	іссапар шығындары	мың теңге	1 189	466	-61%
11.7	кадрларды даярлау	мың теңге	772	508	-34%
11.8	энергия	мың теңге	13 085	10 353	-21%
11.9	коммуналдық қызметтер	мың теңге	1 451	1 279	-12%
11.10	байланыс қызметтері	мың теңге	1 181	521	-56%
11.11	жалдау	мың теңге	2 310	2 920	26%
11.13	еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (мед. тексеру)	мың теңге	223	103	-54%
11.14	банк қызметтері	мың теңге	342	215	-37%
11.15	басқа да қызметтер	мың теңге	19 020	9 439	-50%
11.15.1	газеттер мен журналдарға жазылу	мың теңге	1 618	1 014	-37%
11.15.2	пошта-кеңсе тауарлары	мың теңге	3 854	2 046	-47%
11.15.3	Нотариалдық қызметтер	мың теңге	-	-	
11.15.4	тіркеу бойынша қызметтер	мың теңге	2 216	1 507	-32%
11.15.5	Қызметтік автокөлікті ұстау	мың теңге	3 981	2 206	-45%
11.15.6	кеңсе және басқа жабдықтарды ұстау	мың теңге	398	251	-37%
11.15.7	қызметкерлерді сақтандыру	мың теңге	3 938	2 207	-44%
11.15.8	Материалдар	мың теңге	3 015	208	-93%
11.13.8	Бөгде ұйымдардың өзге де қызметтері	мың теңге		-	
III	<u>Қызмет көрсетуге барлық шығындар</u>	<u>мың теңге</u>	24 404 374	11 732 056	-52%
IV	<u>Пайда</u>	<u>мың теңге</u>	10 215 439	4 589 335	-55%
-	<u>Негізсіз табыс</u>	<u>мың теңге</u>	86 173	86 173	
V	<u>Барлық табыс</u>	<u>мың теңге</u>	34 705 986	16 235 217	-53%
VI	<u>Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі</u>	<u>мың кВтч</u>	3 280 141	1 623 522	-51%
		%	7,68%	7,34%	-4%
VII	<u>Нормативтік техникалық шығындар</u>	<u>мың кВтч</u>	266 864	113 546	-57%
VIII	<u>Тариф</u>	<u>тенге/кВтч</u>	10,58	10,00	-5%

Қызмет көрсетуге арналған өндірістік шығындар

млн. теңге


№ р/с	Атауы	Тариф	Нақты	Ауытқу +,-	%
	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы	23 289	11 205	-12 084	-52%
	Оның ішінде:				
1	Шикізат, материалдар	462	268	-194	-42%
2	Жалақы	7 532	3 911	-3 622	-48%
3	Амортизация	7 200	3 118	-4 082	-57%
4	Жөндеулер	1 326	292	-1 034	-78%
5	Бөгде ұйымдардың қызметтері	76	41	-35	-46%
6	Өзге шығындар	526	211	-315	-60%
7	Ысырап құны	4 859	2 750	-2 109	-43%
8	Жүктемені алып жүруге әзірлігі	609	332	-276	-45%
9	Бөгде желілер бойынша тасымалдау	680	275	-405	-59%
10	Теңгерімдеуші нарық бойынша қызметтер	20	8	-12	-62%

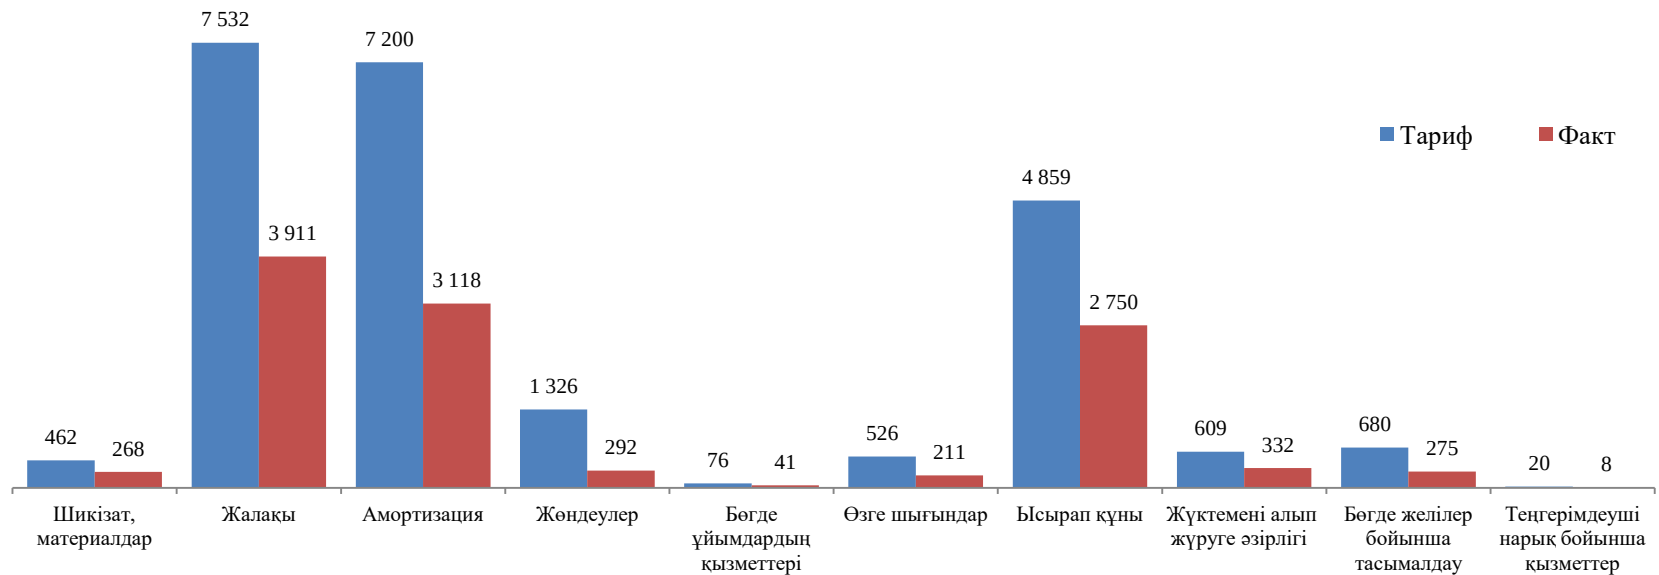

Тарифтік сметамен салыстырғанда нақты әкімшілік шығыстар, млн. теңге



Атауы	Тарифтік сметада бекітілді	Нақты	Ауытқу	
			+, -	%
Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы о.і.:	1 116	527	-588	-53%
ӘБП жалақысы және ЕАҚ бойынша салықтар	514	231	-283	-55%
Салықтық төлемдер	562	265	-297	-53%
Коммуналдық қызметтер	15	12	-3	-20%
Басқа да шығындар	25	19	-6	-24%

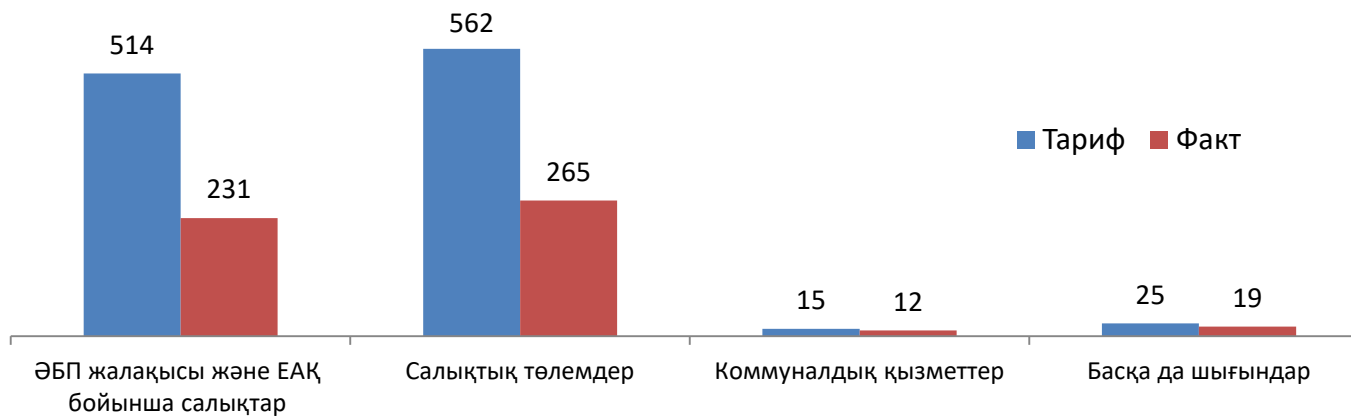

Қаржылық-экономикалық көрсеткіштер




Көрсеткіштер атауы	Формула	Нақты	Норматив/тарифтік смета бойынша
Қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері			
Автономия коэффициенті (СК/СА)	капитал / активтер	0,79	0,5
Қарыз және меншікті қаражат арақатынасының коэффициенті	ұзақ мерзімді қарж. міндет. / меншікті капитал	0,00	1
Табыстылық көрсеткіштері:			
Сатудың табыстылық коэффициенті	жалпы пайда/ түсім	0,31	0,33
Таза пайда бойынша табыстылық	таза пайда/ түсім	28%	29%
Іскерлік белсенділік көрсеткіштері:			
ДБ айналымдылық коэффициенті, күн	ДБ / түсім * 366 күн	79	
КБ айналымдылық коэффициенті, күн	КБ / өзіндік құн * 366 күн	113	
Өтімділік көрсеткіштері:			
Ағымдағы өтімділік коэффициенті	активтер / міндеттемелер	1,4	1-2
Жылдам өтімділік коэффициенті	(ақша қаражаты+қысқа мерз. қарж инв.+қысқа мерз.ДБ) / міндеттемелер	1,2	0,7-1,5

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы ақпарат





Көрсетілген қызметтер көлемі, млн.кВт.сағ.

Атауы	Тариф	Нақты	+, -	Ауытқу	%
Барлығы:	3 280	1 624	-1 657		-51%
Электр энергиясын бөлшектеп сату	1 893	975	-918		-49%
АО "Qarmet"	659	315	-344		-52%
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания" (ТОО "КРЭК")	42	56	14		34%
"КТЖ-Грузовые перевозки" ЖШС	528	197	-331		-63%
Өзге тұтынушылар	3 280	1 624	-1 657		-51%

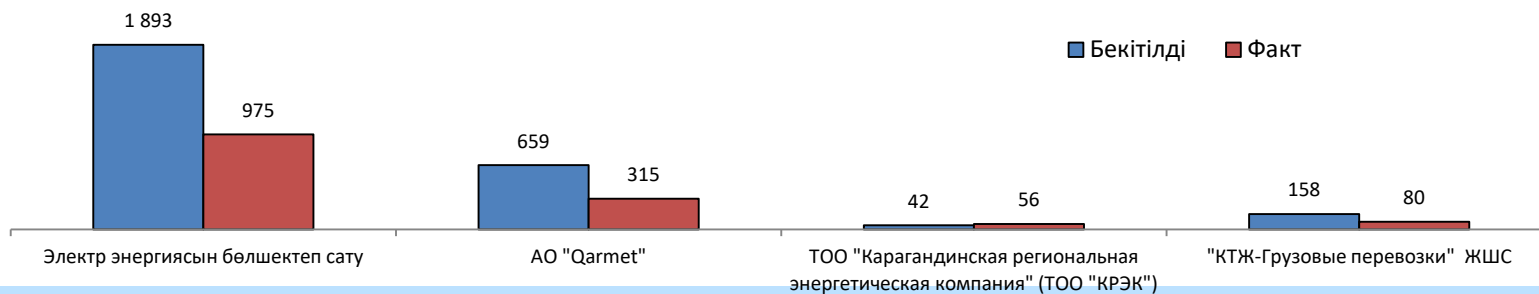

Көрсеткіштер атауы	тариф	Нақты	абс.	Ауытқу	%
Электр энергиясының кіріс көлемі (мың кВт сағ.)	3 554	1 741	-1 813		-51%
Шаруашылық қажеттіліктер (мың кВт сағ.)	7	4	-3		-48%
Нормативтік шығындар (мың кВт сағ.):	267	114	-153		-57%
Нормативтік шығындар, % :	7,68	7,34	-0,34		-4%
Электр энергиясын беру (мың кВт сағ.):	3 280	1 624	-1 657		-51%



- Тұтынушылармен жұмыс жасалған шарттардың талаптарына, ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің, заңдары мен ережелерінің талаптарына сәйкес жүргізілуде.
- Заңды және жеке тұлғалармен түсіндіру-ақпараттық жұмыстар жүргізілуде.
- Тұтынушылардың және ЭЖҰ өтінімдері бойынша жұмыс - электр энергиясын ажырату/қосу, тұтынушының электр қондырғыларында есепке алу аспаптарын қосу сұлбасын тексеру, ауыстыру және т. б.
- Тұтынушылардың электр қондырғыларын тексеру актілерін жасау. Тексеру актісі энергия беруші ұйымның пломбаларының бар-жоғын тексеруді, корпустың зақымдану мәніне ЕА көзбен тексеруді, техникалық шарттардың сақталуын, қосылудың дұрыстығын, ЕА жұмысының дұрыстығын қамтиды.
- Электр энергиясын есепке алу аспаптарын пломбалау есепке алу аспабын пломбалау туралы актіні жасай отырып ЕА қосу сұлбасын тексергеннен кейін жүргізіледі. ЭЭПҚ бұзушылықтары, электр энергиясын коммерциялық есепке алу тізбектеріндегі кемшіліктер мен ескертулер анықталған жағдайда оларды жою мерзімін көрсете отырып, нұсқама/ескерту жазылады

Инвестициялық бағдарламаның іс-шаралар жоспары

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед.изм.	Количество	Сумма, тыс. тенге
	Всего на 2026 год			13 924 477
1	6, 35, 110 кВ қолданыстағы желілерді қайта қоса отырып 110/35/6 кВ Караганда ШС қайта салу (2х40 МВА трансформаторларымен 110-13 сұлбасы бойынша) 1. Қайта салу 110кВ Караганда - ТЭЦ-3 АЖ, 1,2-тізбек, 110кВ Караганда-Новый Город АЖ, 1,2-тізбек; 2. Қайта салу 35кВ Караганда - Майкудук АЖ 1т 35кВ Караганда - ЦЭС-1 АЖ 1т 35кВ Караганда - Пришахтинская АЖ 1,2т; 3. 6кВ КЖ қайта салу 13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,26-ф.	дана км.	1 1,9	1 462 492
2	Караганда ШС кіре отырып 110 кВ АЖ ГПП-1 – Сарань ШС қайта салу, келесі учаскелермен: - ГПП-1 – Караганда ШС 110 кВ АЖ - Сарань ШС – Караганда ШС 110 кВ АЖ	км.	58,97	2 892 043
3	0,4-6-10кВ электр желілері: 0,4кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ КАЖ қайта салу 6(10)кВ ТШС(ЖТШС) техникалық жаңғырту 6(10)кВ КЖ салу 0,4кВ КЖ салу 6(10)кВ ҚЖТШС монтаждау.	км. км. дана км. км. дана	44,51 23,55 28 1,19 1,19 12	3 705 310
4	Мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және/10 кВ SCADA жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені (Қарағанды қ.)	дана	1156	1 602 245
5	«Вольная – Карагандинская» АЖ 35 кВ қайта жаңарту	км	8,62	139 642
6	Федоровка ШС 110/6 кВ құрылысы	дана	1	807 738
7	Н.Майкудук ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Н. Майкудук	дана	1	114 725
8	Н.Дубовка ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Н.Дубовка	дана	1	126 599
9	35 кВ КЖ қайта салу/Реконструкция КЛ-35 кВ	км.	5,6	104 423
10	Кзыл ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Кзыл	дана	1	609 954
11	Ялтинская ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Ялтинская	дана	1	78 421
12	35/110кВ (Майкудук ҚС, ЦЭС ҚС, Миньковка ҚС, Озерная-2 ҚС) мониторинг, өлшеу, авариялық дабыл және жоғарғы деңгейдегі байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені/Аппаратно-программный комплекс мониторинга, измерений, аварийной сигнализации и связи верхнего уровня 35/110кВ (ПС Майкудук, ПС ЦЭС, ПС Миньковка, ПС Озерная-2)	дана	4	383 113
13	Жарык ҚС 110кВ АТҚ (110кВ Болашақ ҚС үшін) екі желілі 110кВ ұяшықтарды монтаждау/Монтаж двух линейных ячеек 110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС Жарык (для ПС-110 кВ Болашақ)	дана	1	152 718
14	Сарань ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Сарань	дана	1	273 266
15	Қарағайлы ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Карагайлы	дана	1	81 404
16	Мелькомбинат ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Мелькомбинат	дана	1	26 876
17	110/35/6кВ "Астаховка" ШС антенналық-дінгекті құрылыс салу/Строительство антенно-мачтового сооружения ПС 110/35/6кВ "Астаховка"	дана	1	20 090
18	Костенко ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Костенко	дана	1	6 697
19	Победа ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Победа	дана	1	16 965
20	ГПП-2 - Сергиополь АЖ 35 кВ қайта жаңарту/Реконструкция ВЛ 35 кВ «ГПП-2 - Сергиополь»	км.	28,33	28 605
21	Қараган-Озерная АЖ 35 кВ қайта жаңарту/Реконструкция ВЛ 35 кВ «Қараган-Озерная»	км.	12,2	17 856
22	Придолинка ШС жабдыктарын техникалық жаңғырту/Техническая модернизация оборудования ПС Придолинка	дана	1	77 462
Қосым. инвест. Бағдарламалар/Дополнительные мероприятия в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции»:				
23	Победа-Энгельса АЖ 35 кВ қайта жаңарту/Реконструкция ВЛ 35 кВ «Победа-Энгельса»	км.	15,32	49 645
24	110/10кВ "Болашақ" ШС салу/Строительство ПС110/10кВ "Болашақ"	дана	1	1 146 190

Назарларыңызға рахмет!
